
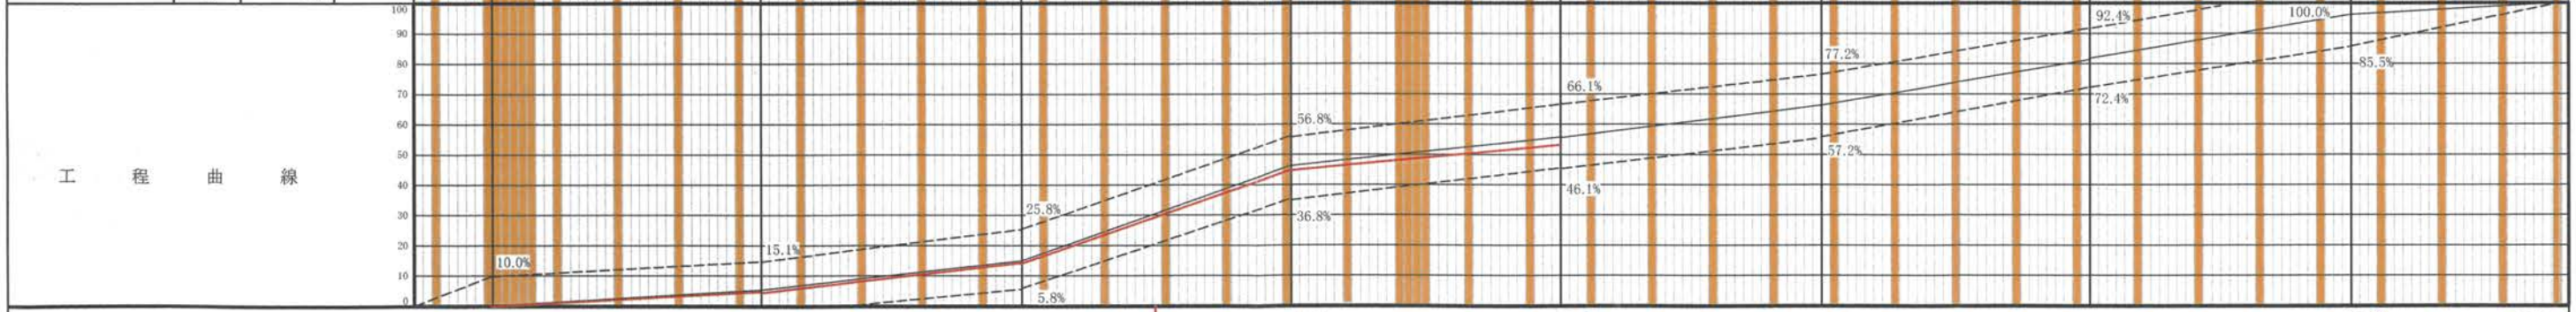


工事番号：  
 工事名： 国道27号木崎地区交差点改良他工事

# 実 施 工 程 表

工 期  
 平成23年 4月22日  
 平成23年12月25日

請負者： 株式会社 道端組

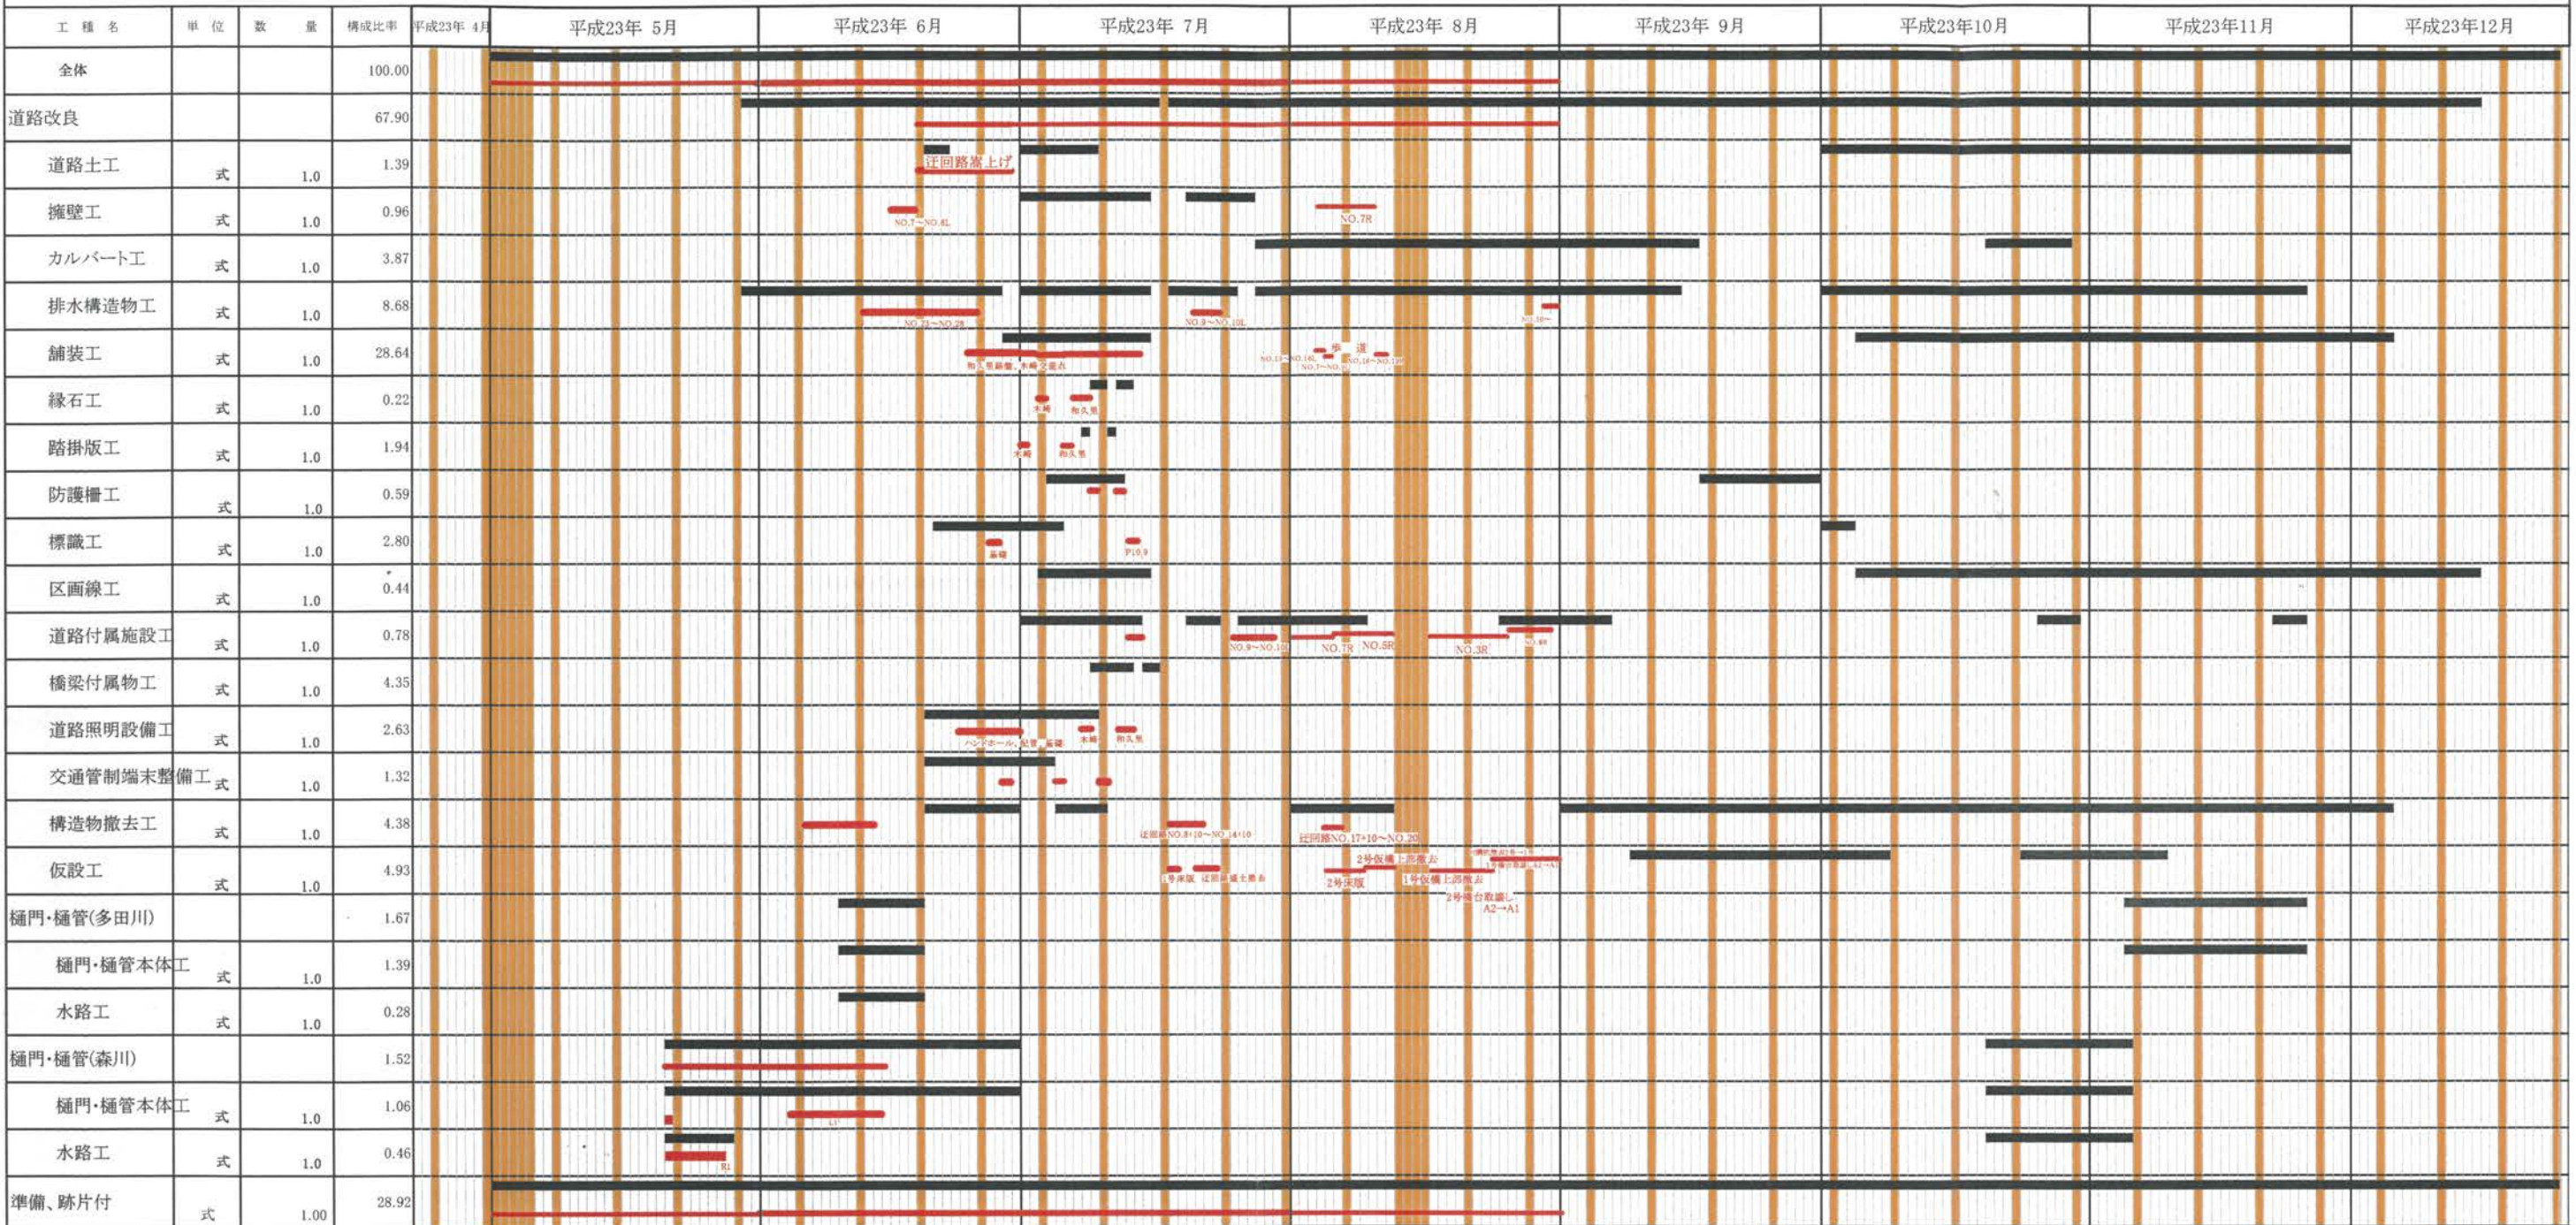

| 日付  | 0.0% | 5.1% | 15.8% | 46.8% | 56.1% | 67.2% | 77.2% | 82.4% | 92.4% | 100.0% |
|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 進捗率 | 0.0% | 4.0% | 15.6% | 44.2% | 52.7% | 66.1% | 57.2% | 72.4% | 85.5% | 100.0% |

記 事
